Instalación de AMIS 2022 y proyecciones 2023





Estado actual AMI







17%

15 Age

424946 **AMIs**

Cobertura Nacional 48.29%

Corte 31 marzo 2023

Fuente: Sistema Comercial Eléctrico

CARIBE

24%

Age



11%


14 Age




Corte 31 marzo 2023

Fuente: Sistema Comercial Eléctrico


Parque de Medidores ICE




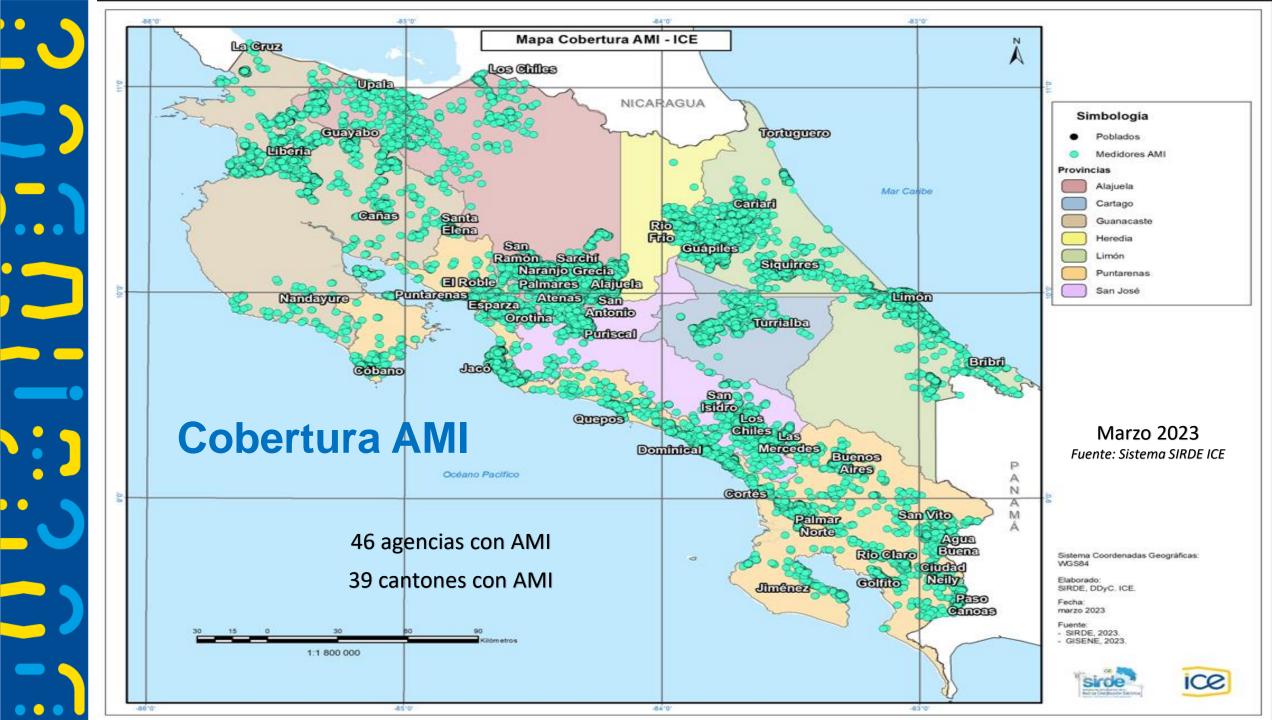

Avances AMI - Costa Rica y América Central



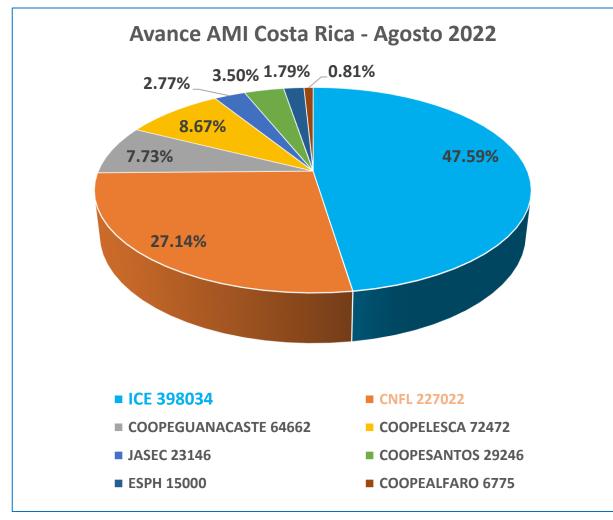

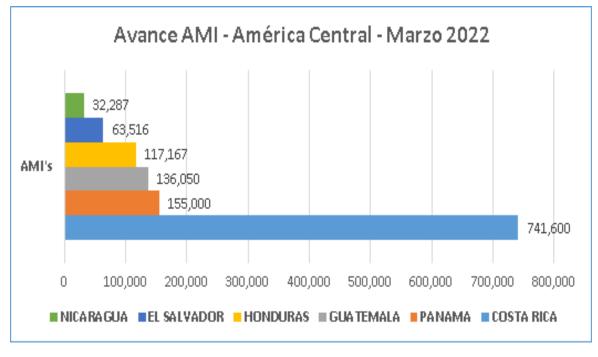

Fuente: Northwest Group.

Fuente: Empresas Distribuidoras.





Capacidades desarrolladas



Tarifa residencial horaria

Definición de horario

Punta 1: entre las 10:01 y las 13:00 horas Punta 2: entre las 18:01 y las 21:00 horas Valle 1: entre las 05:31 y las 10:00 horas Valle 2: entre las 13:01 y las 18:00 horas Valle 3: entre las 21:01 y las 23:00 horas Nocturno: entre las 23:01 y las 05:30 horas




Electricidad Prepago





Analítica de datos



Generación Distribuida








AMI Agua



Estudios técnicos





Estado Licitación AMI BID



Adjudicación Sesión CD 01/02/2023

POR TANTO, POR UNANIMIDAD ACUERDA:

 Adjudicar la Licitación Pública Internacional 2021LI-000007-PROV, promovida para la adquisición de medidores con comunicación remota con radio frecuencia AMI RF (Medidores inteligentes), de la siguiente manera:

MONTO TOTAL RECOMENDADO: 10 470 716.97 USD

PLAZO DE ENTREGA:

Plazo de entrega de 1 a 790 días naturales.

80% Adjudicado

No. Art	Descripción	Cant. Inicial	Cant. Adjudicada
1	MEDIDOR FM2S, CON CORTA Y DESCONEXIÓN REMOTA. LICENCIA INCLUIDA.	106,000	84,800
2	MEDIDOR FM12S. LICENCIA INCLUIDA	200	160
3	MEDIDOR FM16S, LICENCIA INCLUIDA.	500	400
4	MEDIDOR FORMA FM10A, LICENCIA INCLUIDA.	300	240
5	COLECTOR DE DATOS	172	138
6	EQUIPO PORTATIL PARA CAMPO CON RADIO RF	16	13

Estado:

- ✓ En resolución de apelación ante Contraloría General de la República.
- ✓ Estimación de recepción de medidores a finales de 2023.
- ✓ Instalación de 85K medidores entre 2024-2025.

Instalación por Operación y Mantenimiento. Avance I Trimestre 2023 = 4350 medidores



Estimación de instalación



